

PROGRES REPORT
LAPORAN KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN

PEKERJAAN :

Perawatan Jalan Khusus Kompleks

LOKASI

Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian

Jl. Jakenan - Jaken KM. 05 Jaken, Pati

PERIODE MINGGU KE	: I (Satu)	
TANGGAL	: 13-Jan	s/d
	19-Jan-25	
REALISASI PEKERJAAN	: 42.62	%

Pelaksana :



CV. ARDIKA KARYA
Contraktor & Supplier

Ds. Kedungsari RT. 5/ RW. 2 Kec. Tayu - Pati 59155 HP.089 689 623 677
E_Mail : ardikakarya82@yahoo.co.id / ardikakarya@gmail.com

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN					Minggu ke - : I (Satu)			
PEKERJAAN : Perawatan Jalan Khusus Kompleks Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian					Periode : 13-Jan s/d 19-Jan-25			
LOKASI : Jl. Jakenan - Jaken KM. 05 Jaken, Pati					KONTRAKTOR : CV. ARDIKA KARYA			
TAHUN : 2025								
No	Uraian Pekerjaan	Volume	Sat	Bobot (%)	Perkembangan Kuantitas Pekerjaan			KETERANGAN
					Minggu Lalu	Minggu Ini	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	DIVISI 1. UMUM							
1	Mobilisasi & demobilisasi	1	Is	0.4897		0.2448	0.2448	
II.	DEVISI 5. PEKERJAAN PREVENTIF							
1	Latasir Kelas A (SS-A) Manual	1568.00	M2	68.3321		13.6664	13.6664	
III.	DEVIISI 7. PERKERASAN ASPAL							
1	Lapis Perekat - Aspal Cair	314.60	Liter	3.0827		0.6165	0.6165	
2	Leveling Penetrasi Macadam	25.29	M3	26.5421		26.5421	26.5421	
IV.	DIVISI 11. PEKERJAAN PEMELIHARAAN							
1	Perbaikan Lapis Pondasi Agregat Kelas A	6.00	M3	1.5534		1.5534	1.5534	
JUMLAH TOTAL				100.00	-	42.6233	42.6233	
TERLAMBAT / MENDAHULUI					Realisasi Mingguan			42.6233
					Realisasi Kumulatif Mingguan			42.6233
					Rencana Mingguan			0.3047
					Rencana Kumulatif Mingguan			0.3047
					Selisih Realisasi & Rencana Pekerjaan			42.3185



Disetujui oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian

ATYK MARYATI, ST.
NIP. 198503032011012020

Diperiksa :
Pengawas Lapangan


SUDARMIN
NIP. 196805161998031001

Pati, April 2025
Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. ARDIKA KARYA

SUPRIYANTO, SE.
Direktur

PROGRES REPORT
LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

PEKERJAAN :

Perawatan Jalan Khusus Kompleks

LOKASI

Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian

Jl. Jakenan - Jaken KM. 05 Jaken, Pati

PERIODE MINGGU KE	: II (Dua)	
TANGGAL	: 20-Jan	s/d
	26-Jan-25	
REALISASI PEKERJAAN	: 100.00	%

Pelaksana :



CV. ARDIKA KARYA
Contraktor & Supplier

Ds. Kedungsari RT. 5/ RW. 2 Kec. Tayu - Pati 59155 HP.089 689 623 677
E_Mail : ardikakarya82@yahoo.co.id / ardikakarya@gmail.com

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN					Minggu ke - : II (Dua)			
PEKERJAAN : Perawatan Jalan Khusus Kompleks Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian					Periode : 20-Jan s/d 26-Jan-25			
LOKASI : Jl. Jakenan - Jaken KM. 05 Jaken, Pati					KONTRAKTOR : CV. ARDIKA KARYA			
TAHUN : 2025								
No	Uraian Pekerjaan	Volume	Sat	Bobot (%)	Perkembangan Kuantitas Pekerjaan			KETERANGAN
					Minggu Lalu	Minggu ini	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	DIVISI 1. UMUM							
1	Mobilisasi & demobilisasi	1	Is	0.4897	0.2448	0.2448	0.4897	
II.	DEVISI 5. PEKERJAAN PREVENTIF							
1	Latasir Kelas A (SS-A) Manual	1568.00	M2	68.3321	13.6664	54.6657	68.3321	
III.	DEVIISI 7. PERKERASAN ASPAL							
1	Lapis Perekat - Aspal Cair	314.60	Liter	3.0827	0.6165	2.4662	3.0827	
2	Leveling Penetrasi Macadam	25.29	M3	26.5421	26.5421		26.5421	
IV.	DIVISI 11. PEKERJAAN PEMELIHARAAN							
1	Perbaikan Lapis Pondasi Agregat Kelas A	6.00	M3	1.5534	1.5534		1.5534	
JUMLAH TOTAL				100.00	42.6233	57.3767	100.0000	
TERLAMBAT / MENDAHULUI					Realisasi Mingguan			57.3767
					Realisasi Kumulatif Mingguan			100.0000
					Rencana Mingguan			15.5843
					Rencana Kumulatif Mingguan			15.8890
					Selisih Realisasi & Rencana Pekerjaan			84.1110



Disetujui oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian

ATYK MARYATI, ST.
NIP. 198603032011012020

Diperiksa :
Pengawas Lapangan


SUDARMIN
NIP. 196805161998031001

Pati, Januari 2025
Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. ARDIKA KARYA


SUPRIYANTO, SE.
Direktur



Foto 0 % STA. 0+0.000



Foto 50 % STA. 0+0.000



Foto 100 % STA. 0+0.000



Foto 0 % STA. 0+0.100



Foto 50 % STA. 0+0.100



Foto 100 % STA. 0+0.100



Foto 0 % STA. 0+0.100



Foto 50 % STA. 0+0.100

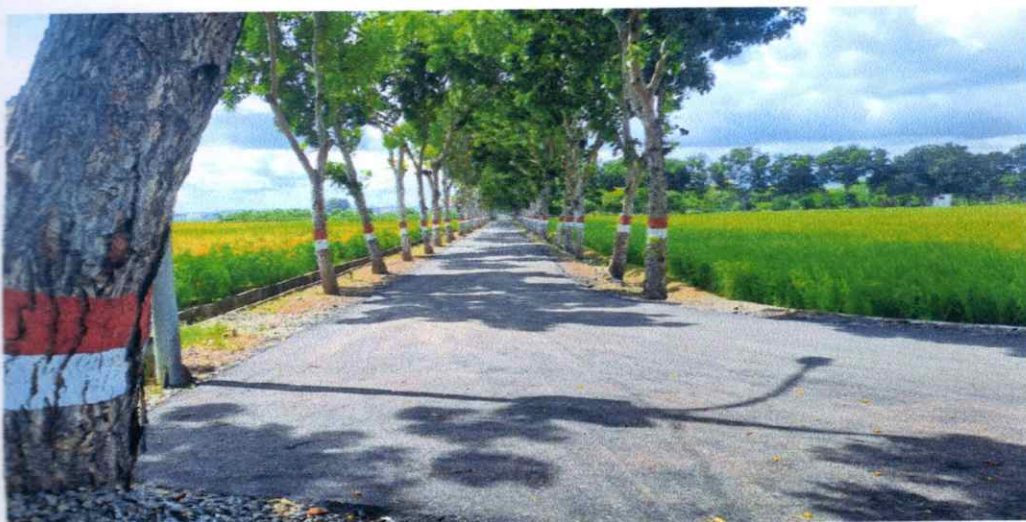


Foto 100 % STA. 0+0.100



Foto 0 % STA. 0+0.243



Foto 50 % STA. 0+0.243



Foto 100 % STA. 0+0.243



Foto 0 % STA. 0+0.516



Foto 50 % STA. 0+0.516



Foto 100 % STA. 0+0.516



Foto 0 % STA. 0+0.721



Foto 50 % STA. 0+0.721



Foto 100 % STA. 0+0.721



Foto Pekerjaan LPA



Foto Pekerjaan LPA



Foto Pekerjaan Leveling Penetrasi Macadam



Foto Pekerjaan Leveling Penetrasi Macadam



Foto Pekerjaan Leveling Penetrasi Macadam



Foto Pemeriksaan akhir pekerjaan



Foto Pemeriksaan akhir pekerjaan



Foto Pemeriksaan coring



Foto Pemeriksaan coring



Foto Pemeriksaan coring
